


**Управление образования администрации
муниципального района «Новооскольский район»**

**СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА
НА БАЗЕ 4-Х ШКОЛ ГОРОДА**

Заместитель начальника управления образования
Лакомова Марина Борисовна

Новый Оскол, 2017 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

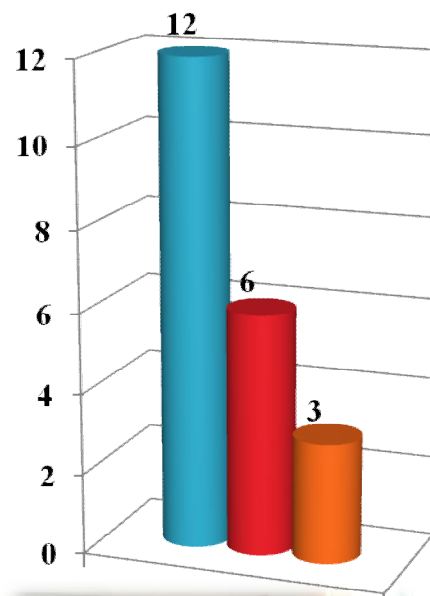

- количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады 2014 год
- количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады 2015 год
- количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады 2016 год



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К 1 декабря 2017 года создать условия для качественной подготовки не менее 150 учащихся общеобразовательных учреждений Новооскольского к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников.
Способ достижения цели:	Создание муниципального центра по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников в Новооскольском районе
Результат проекта:	Организована работа муниципального центра по подготовке не менее 150 учащихся общеобразовательных учреждений района к всероссийской олимпиаде школьников
Требования к результату:	<ol style="list-style-type: none">1. Организована дистанционная подготовка к олимпиадам через участие в различных предметных конкурсах и дистанционных олимпиадах не менее 100 учащихся2. Обеспечена консультационная поддержка не менее 150 учащихся, не менее 70 педагогов и не менее 100 родителей по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад3. Курсы повышения квалификации прошли не менее 10 учителей4. Составлены методические рекомендации по подготовке учащихся к всероссийской олимпиаде школьников5. Оказана психолого-педагогическая помощь по подготовке к олимпиаде не менее 40 учащимся и не менее 10 педагогам6. Проведен аналитический семинар по выявлению причин низких результатов олимпиад и разработке рекомендаций по их устранению для не менее 35 педагогов
Пользователи результата проекта:	Учащиеся, педагоги, родители общеобразовательных учреждений Новооскольского района

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



**МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны
Ольги Николаевны Романовой»**



МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»

**муниципальный центр по подготовке
к всероссийской олимпиаде школьников для учащихся
общеобразовательных учреждений района на базе 4-х школ города**



МБОУ «СОШ № 3»



МБОУ «СОШ № 4»

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



Психолого-педагогическое
сопровождение



Создание банков данных



Повышение квалификации
учителей



**СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ**



Дистанционная подготовка к
олимпиадам через участие в
различных предметных
конкурсах и дистанционных
олимпиадах

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год								
					01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	Подготовительный этап	60	10.01.17	28.02.17									
1.1	Анализ результативности участия школьников общеобразовательных организаций Новооскольского района в муниципальном и региональном этапе всероссийской олимпиады по учебным предметам за 2016-2017 учебный год.	29	10.01.17	17.02.17									
1.2.	Первичное анкетирование учащихся на выявление их общей и предметной одаренности.	41	13.03.17	22.05.17									
1.3.	Формирование нормативно-правовой базы по работе с одаренными детьми:	30	27.03.17	19.05.17									
1.4.	Обеспечение консультационной поддержки учащихся, педагогов и родителей по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад.	55	01.06.17	18.08.17									
1.5.	Размещение актуальной информации по вопросам подготовки и проведения олимпиад на сайтах образовательных организаций, отдела образования.	30	03.07.17	11.08.17									

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год												
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2	Основной этап	250	10.02.17	20.11.17													
2.1	Аналитический семинар по выявлению причин низких результатов олимпиад и разработке рекомендаций по их устранению.	29	10.02.17	17.03.17													
2.2.	Организация индивидуальных консультаций для учителей, испытывающих затруднения при подготовке учащихся к олимпиадам	41	13.03.17	22.05.17													
2.3.	Семинары-практикумы по распространению лучшего опыта подготовки к олимпиадам	30	27.03.17	19.05.17													
2.4.	Повышение квалификации учителей.	55	01.09.17	31.12.17													
2.5.	Разработка системы обучающих школьных семинаров с педагогами, испытывающими затруднения при подготовке обучающихся к олимпиадам.	30	03.07.17	11.08.17													

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год												
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
3	Заключительный этап	260	10.02.17	20.11.17													
3.1	Размещение на официальном сайте информации о ходе реализации проекта	29	10.10.17	17.11.17													
3, 2.	Провести сравнительный анализ состояния ситуации в начале и в конце проекта	41	13.09.17	22.10.17													
3, 3.	Составить методические рекомендации по подготовке учащихся к всероссийской олимпиаде школьников	30	27.06.17	19.08.17													
3, 4.	Размещение актуальной информации по вопросам подготовки и проведения олимпиад на сайтах образовательных организаций, управления образования.	55	01.09.17	31.12.17													
4	Итого	260	10.01.17	31.12.17													

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1	Подготовительный этап								
1.1	Анализ результативности участия школьников общеобразовательных организаций Новооскольского района в муниципальном и региональном этапе всероссийской олимпиады по учебным предметам за 2016-2017 учебный год.								
1.2.	Первичное анкетирование учащихся на выявление их общей и предметной одаренности.								
1.3.	Формирование нормативно-правовой базы по работе с одаренными детьми:								
1.4.	Обеспечение консультационной поддержки учащихся, педагогов и родителей по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад.								
1.5.	Размещение актуальной информации по вопросам подготовки и проведения олимпиад на сайтах образовательных организаций, отдела образования.								

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
2	Основной этап								
2.1	Аналитический семинар по выявлению причин низких результатов олимпиад и разработке рекомендаций по их устранению.								
2.2.	Организация индивидуальных консультаций для учителей, испытывающих затруднения при подготовке учащихся к олимпиадам								
2.3.	Семинары-практикумы по распространению лучшего опыта подготовки к олимпиадам								
2.4.	Повышение квалификации учителей.				25,0				
2.5.	Разработка системы обучающих школьных семинаров с педагогами, испытывающими затруднения при подготовке обучающихся к олимпиадам.								

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
3	Заключительный этап								
3.1	Размещение на официальном сайте информации о ходе реализации проекта								
3,2	Провести сравнительный анализ состояния ситуации в начале и в конце проекта								
3,3	Составить методические рекомендации по подготовке учащихся к всероссийской олимпиаде школьников								
3,4	Размещение актуальной информации по вопросам подготовки и проведения олимпиад на сайтах образовательных организаций, управления образования.								
Всего:		25,0			25,0				

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
1	Прямое бюджетное финансирование			25,0
2	Земельный участок			
3	Инфраструктура			
3.1	Дороги			
3.2	Электроэнергия			
3.3	Газоснабжение			
3.4	Водоснабжение			
4	Субсидии			
5	Обеспечение			
5.1	Гарантии			
5.2	Залоги			
6	Прочие формы участия			
Итого:				25,0

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Участие населения в реализации проекта	Тыс. чел.	1,5
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	0,025
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль в проекте
1.	Богачев Виктор Алексеевич	Заместитель главы администрации района по социальной политике	Куратор проекта
2.	Нехаев Юрий Николаевич	Начальник управления образования	Руководитель проекта
3.	Лакомова Марина Борисовна	Заместитель начальника управления образования	Администратор проекта
4.	Крылова Ирина Алексеевна	Заместитель начальника управления образования	Оператор проекта
5.	Титова Наталья Вячеславовна	Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа бюджетного процесса управления образования	Член рабочей группы проекта (р)
6..	Дудникова Ирина Ивановна	Директор МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой" г.Новый Оскол	Член рабочей группы проекта (р)
7.	Понедельченко Ольга Михайловна	Директор МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Новый Оскол Белгородской области	Член рабочей группы проекта (р)
8.	Горбатко Лидия Николаевна	Директор МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской области	Член рабочей группы проекта (р)
9.	Величко Елена Валерьевна	Директор МБОУ «СОШ №4 г.Новый Оскол Белгородской области»	Член рабочей группы проекта (р)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта: Нехаев Юрий Николаевич

Электронный адрес: <http://www.edunoskol.ru/>,

тел. 8 (47 233) 4-50-90

Администратор проекта: Лакомова Марина Борисовна

тел. 8 (47 233) 4-51-47
